



屋島総合病院新築移転工事

◎進捗状況

- ・平成28年6月6日（工事進行状況）
- ・平成28年3月16日（工事進行状況）
- ・平成27年4月30日（躯体工事）
- ・平成26年11月28日（基礎工事）
- ・平成26年10月27日（杭工事・土工事）
- ・平成26年9月26日（起工式）
- ・平成26年9月16日（準備工事）
- ・平成26年9月10日（新病院の概要）

平成28年6月6日（工事進行状況）

[一覧に戻る](#)

新病院は、平成28年7月中旬に完成予定です。

新築移転工事は全体の93%が終了しています。

躯体工事は、ほぼ終了しました。現在は、内装工事を行っています。建物は平成28年7月中旬に完成する予定で、オープンは平成28年11月の予定です。

工事期間中、近隣の皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

建築用仮設作業床が撤去され、新病院の外観が現れました。



○建築全景

床や天井が貼られ、明るく開放的な環境となっています。



○1階外来

防水工事は終了し、現在は機材を設置しています。



○屋上

開放的なスタッフステーションとなっています。



○病棟スタッフステーション

明るく広い病室になっています。



○病室（4床室）

クリーン度の高い高機能の手術室です。



○手術室

平成28年3月16日（工事進行状況）

[一覧に戻る](#)

順調に進行しています。

新築移転工事は全体の約70%が終了しています。

躯体工事だけでなく内装工事も計画通り進行しています。オープンは、予定通り平成28年11月の予定です。

工事期間中、近隣の皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。


4階までの躯体工事が概ね終了し、新病院の外観がわかります。



○建築全景

南側一面をガラス張りとし、景観を望めるような構造で

す。

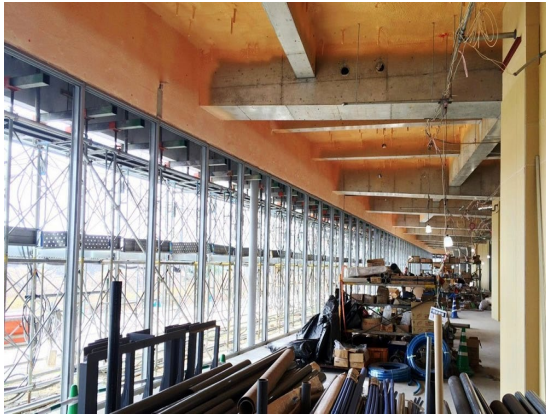

○1階外来部分

防水工事を行っています。

ここでは、アスファルトを塗っています。



○屋上

天井裏の状況です。

ここにも、各種配線等が通っており、これから天井ボードを取り付けます。



○2階検査室

床工事をしています。

床下には、各種配線が通っています。



○3階病室

平成27年4月30日（躯体工事）

[一覧に戻る](#)

躯体工事を行っています。

基礎工事が終わり、1階部分の躯体工事を行っています。

躯体工事用のタワークレーンを設置しました。

5月以降、躯体工事の進行に伴い、建物の形状が徐々に現れてきます。

工事は計画どおり順調に進んでいます。完成は平成28年夏頃の予定で、オープンは平成28年11月の予定です。

工事期間中、近隣の皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。



○現場全景



○タワークレーン



○工事現場 1



○工事現場 2



○工事現場 3

基礎工事を行っています。

11月中頃より本格的に基礎工事を行っています。

基礎工事とは、構造物（建物）を支持し、これを安定させる為の基礎を造る工事です。構造物の土台となる部分にコンクリートや鉄筋などを使用し、強固で安定した基礎を作ります。なお、本工事は、南海トラフ地震に耐えられるよう、鉄筋コンクリートによる耐震構造で施工しています。

天候にも恵まれ、工事は計画どおり順調に進んでいます。平成27年2～3月頃より、1階部分の躯体工事を開始する予定です。

工事期間中、近隣の方々には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。





平成26年10月27日（杭工事・土工事）

[一覧に戻る](#)

杭工事・土工事を行っています。

10月1日より杭工事・土工事を行っております。

新病院は、鉄筋コンクリート造地上4階建の耐震構造で計画しています。

建物の荷重を支えるための杭を打ち込んでいます。また、地下の構造体を造るための土工事も行っています。

12月からは、基礎工事を開始する予定です。

工事期間中、近隣の方々には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。



○杭工事



○整地後



○着工前

屋島総合病院新築移転工事の起工式を行いました。

平成26年9月26日(金)、屋島総合病院新築移転工事の起工式を行いました。

晴天の下、高松副市長、香川大学学長をはじめ、多くのご来賓の方々にご臨席を賜り、盛大に執り行いました。

鍬入の儀・玉串奉奠などの神事を行い、工事の安全を祈願しました。

平成26年10月より本体工事を開始し、平成28年7月に竣工、**平成28年11月に開院を予定**しております。

工事期間中、近隣の方々には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。



○鍬入の儀：斎鎌（いみかま）



○鍬入の儀：斎鍬（いみくわ）



○鍬入の儀：斎鋤（いみすき）



○玉串奉奠



○宮武会長 あいさつ


平成26年9月16日（準備工事）

[一覧に戻る](#)

準備工事を行っています。

まず、敷地を整備しております。天候が不順ではありますが、工事は概ね順調に進行しています。

茂っていた木々が伐採され、地面が見えてまいりました。

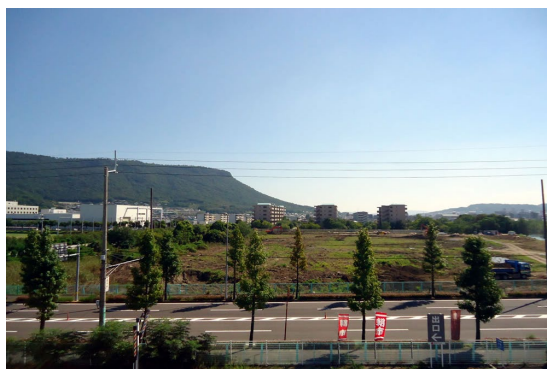

工事期間中は、大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

屋島総合病院新築移転工事を行っています。

新病院の概要は以下の通りです。

構造・階数	鉄筋コンクリート・地上4階建て
敷地面積	20,000㎡
延べ床面積	20,000㎡
病床数	279床

新病院移転先



平成28年秋の開院を目指し、現在準備工事を行っています。新病院は、東南海地震に備えた耐震構造で、1床あたりの床面積が8㎡以上となり、安心して快適な療養環境をご提供できるよう計画しております。

工事期間中は、大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
